Solutions
CSP

PROJEKT-PORTFOLIO-MANAGEMENT

Funktionsbaum · Insel Gruppe · Entwurf

26. Oktober 2026 · Intern



Sieben Module, 23 Domains, 87 Business Cases,
— vom strategischen Ziel bis zum gemessenen Nutzen.

Worum es geht.
Und wo es aufhört.

Der Funktionsbaum beschreibt ein System für die Strategieumsetzung und das Projektportfoliomanagement der Insel Gruppe: vom strategischen Ziel über Bewertung und Gates bis zum gemessenen Nutzen, auf drei Portfolioebenen.

Er folgt der CSP-Methode: Business Modules gruppieren Business Domains, diese gruppieren Business Cases. Jeder Business Case beschreibt, was ein User erreichen will und wie er das mit dem System tut — und woher wir das wissen.

7
Business Modules, davon eines für Application Management

23
Business Domains

87
Business Cases, davon 68 aus Unterlagen der Insel Gruppe belegt

Gehört dazu

- **Strategische Ziele, Jahresziele, Metriken**
- **Ideen und Projektverträge**
- **Bewertung, Priorisierung, Szenarien**
- **Portfolioentscheide und Roadmap**
- **Status, Gates, Änderungen, Abschluss**
- **Finanzen, Risiken, Nutzen, Reporting**
- **Ressourcen und Kapazitäten**
- **Drei Portfolioebenen** strategisch, GL, Direktionen

Umsystem oder ausserhalb

- **Strategiearbeit** Trends, PESTEL-Analyse
- **Budgetprozess** erhält Input
- **ERP** Ist-Kosten, noch offen
- **HR-System** Personal, Abwesenheiten
- **Operatives Projektmanagement** Aufgaben, Arbeitspakete, Detailplanung

Woher es kommt.
Und wer damit arbeitet.

Quellen

Q6 Insel Gruppe, Eckpunkte PPM
9 Folien vom 26.10.2026: F1 Strategieumsetzung, F2 Jahreszyklus, F3 Zielstruktur, F4 Portfolios und Rollen, F5 Projektorganisation, F6 Phasen und Gates, F7 Dashboard, F8–F9 Portfolio-Mockups

Q7 Insel Gruppe, Vorlage Projektvertrag
Kopf, Kap. 1–13, Freigabe; Basis ist das PM-Handbuch der Insel Gruppe

Q1 Lebenszyklus der Geschäftsobjekte
analytisch

Q2 Event-Partitionierung
analytisch

Q3 Ziele je Akteur
analytisch

Q4 PMI, The Standard for Portfolio Management
Referenzstandard

Q5 AXELOS, Management of Portfolios (MoP)
Referenzstandard

Akteure

VR	Verwaltungsrat, Programmauftraggeber
CEO	Programmsponsor
PRAT	Programmausschuss Transformation (GL)
UE	Unternehmensentwicklung, Programmleitung
GL	Geschäftsleitung
GLPA	Gremium GL-Portfolio [OFFEN]
DIR	Gremium Direktionen [OFFEN]
AG	Auftraggeber/in
SP	Projektsponsor (GL-Mitglied, Direktion)
CTL	Clinical Transformation Lead
PL	Projektleitung
AS	Antragsteller/in
FI	Finanzen [OFFEN]
RM	Ressourcenmanagement [OFFEN]
ADM	Administrator/in

Der Funktionsbaum.
Sieben Module, ein Blick.

ZM Zielmanagement	ZM.01	Strategie und Handlungsfelder	2 BC
	ZM.02	Jahresziele und Massnahmen	4 BC
	ZM.03	Zielerreichung und Reviews	3 BC
DM Demand Management	DM.01	Projektideen	4 BC
	DM.02	Projektvertrag	7 BC
PP Portfolioplanung	PP.01	Strategische Ausrichtung	2 BC
	PP.02	Bewertung und Priorisierung	5 BC
	PP.03	Szenarien und Balancing	4 BC
	PP.04	Portfolioentscheide	5 BC
PS Portfoliosteuerung	PS.01	Statusberichterstattung	4 BC
	PS.02	Phasen, Gates, Meilensteine	5 BC
	PS.03	Änderungen und Eskalationen	4 BC
	PS.04	Abschluss	3 BC
	PS.05	Stakeholder und Kommunikation	3 BC
PC Portfoliocontrolling	PC.01	Finanzen	5 BC
	PC.02	Risiken	4 BC
	PC.03	Nutzen und KPIs	2 BC
	PC.04	Reporting	3 BC
RK Ressourcen und Kapazitäten	RK.01	Kapazitätsangebot	2 BC
	RK.02	Bedarf und Zuteilung	6 BC
AM Application Management	AM.01	Benutzer und Berechtigungen	3 BC
	AM.02	Stammdaten und Konfiguration	4 BC
	AM.03	Vorlagen, Schnittstellen, Protokoll	3 BC

BC: Anzahl Business Cases je Domain. Application Management bündelt die Grundlagen, die alle anderen Module nutzen.

Zielmanagement.
Strategie wird messbar.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
ZM.01 STRATEGIE UND HANDLUNGSFELDER			
ZM.01.01	**Strategische Handlungsfelder pflegen** Die fünf Handlungsfelder als oberste Ordnung für Ziele und Vorhaben führen.	GL, ADM	Q6 F1, F8
ZM.01.02	**Strategische Ziele festlegen** Mehrjahresziele je Handlungsfeld festhalten und jährlich aktualisieren.	VR, GL	Q6 F2 Strategie-Aktualisierung, F3
ZM.02 JAHRESZIELE UND MASSNAHMEN			
ZM.02.01	**Jahresziele ableiten** Aus den strategischen Zielen die Kernziele für das Folgejahr bestimmen.	GL	Q6 F2 Zielsetzung, F3
ZM.02.02	**Jahresziele freigeben** Die Jahresziele durch den VR verbindlich freigeben lassen.	VR	Q6 F2 «Freigabe: VR»
ZM.02.03	**Hauptaktivitäten festlegen** Jahresziele in Massnahmen mit Verantwortlichen übersetzen.	GL	Q6 F2 Vorbereitung Umsetzung, F3
ZM.02.04	**Zielmetrik definieren** Für jedes Ziel festlegen, woran die Erreichung gemessen wird.	GL	Q6 F1, F3 «Metrik»
ZM.03 ZIELERREICHUNG UND REVIEWS			
ZM.03.01	**Zielerreichung erfassen** Den Stand je Ziel anhand der Metrik nachführen.	GL, UE	Q6 F1 «Zielerreichung»
ZM.03.02	**Quartalsreporting an den VR erstellen** Dem VR den Fortschritt zu Strategie und Zielen vorlegen, damit er nachsteuern kann.	UE, CEO, VR	Q6 F1, F2 Quartals-Review
ZM.03.03	**Jahresrückblick auswerten** Ergebnisse und Erkenntnisse des Jahres auswerten und den nächsten Zyklus planen.	PRAT	Q6 F2 Rückblick Q4

Demand Management.
Aus Bedarf wird Vertrag.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
DM.01 PROJEKTIDEEN			
DM.01.01	**Projektidee erfassen** Einen Bedarf mit wenig Aufwand festhalten: Kurzbeschrieb, Problem, erwarteter Nutzen.	AS	Q6 F8 «Pre P0 Ideen»; Q2
DM.01.02	**Projektidee qualifizieren** Am Eintritt P0 prüfen: strategisch relevant, Ziel klar, klinische Frage, ICT, Infrastruktur.	UE, SP	Q6 F6 Eintritt P0
DM.01.03	**Projektideen zusammenführen** Doppelspurigkeiten vermeiden, indem gleichartige Ideen zusammengelegt werden.	UE	Q1; Q3
DM.01.04	**Projektidee zurückweisen** Eine nicht verfolgte Idee begründet abschliessen und Antragstellende informieren.	UE	Q1

Erst die Idee, dann der Vertrag.
Aufwand erst, wenn es sich lohnt.

Demand Management. Fortsetzung.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
DM.02 PROJEKTVERTRAG			
DM.02.01	**Projektvertrag erstellen** Ausgangslage, Strategiebezug, Ziele, Lösung, Planung, Organisation, Ressourcen, Risiken und Change für Phase 1 erfassen.	PL, SP	Q7 Kap. 1–11; Q6 F8
DM.02.02	**Projektvertrag zur Prüfung einreichen** Den Vertrag in den Status «in Prüfung» bringen.	PL	Q7 Kopf «Status»
DM.02.03	**Projektvertrag überarbeiten** Rückmeldungen aus Review oder Gremium einarbeiten und erneut einreichen.	PL	Q7 Kap. 12; Q1
DM.02.04	**Projektvertrag zurückziehen** Ein nicht mehr verfolgtes Vorhaben aus dem Prozess nehmen.	SP	Q1
DM.02.05	**Quality Review durchführen** Vollständigkeit und Einhaltung des PM-Handbuchs prüfen.	UE	Q7 Kap. 12
DM.02.06	**Projektvertrag freigeben** Auftraggeber, Sponsor, PL und CTL vereinbaren die Durchführung; die Version wird zur Baseline.	AG, SP, PL, CTL	Q7 Kap. 12, Handhabung
DM.02.07	**Projektvertrag als Dokument ausgeben** Den Vertrag aus den erfassten Daten im Layout der Vorlage erzeugen.	PL, UE	Q7 Vorlage; Q3

Portfolioplanung.
Die richtigen Vorhaben wählen.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PP.01 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG			
PP.01.01	~~Strategische Ziele erfassen~~ entfällt · Aufgegangen in ZM.01.02.	–	Q6 F1–F3
PP.01.02	**Bewertungsmodell festlegen** Das Kriterienraster mit Kriterien und Gewichten definieren.	UE, PRAT	Q6 F1 Kriterienraster, F8
PP.01.03	**Portfoliokategorien und Budgetrahmen festlegen** Investitionen steuern: Kategorien mit Budgetrahmen definieren.	UE, FI, PRAT	Q5 [OFFEN]
PP.02 BEWERTUNG UND PRIORISIERUNG			
PP.02.01	**Vorhaben bewerten** Nutzen, Risiko und Ressourcenbedarf eines Vorhabens einstufen.	UE	Q6 F8, F9
PP.02.02	**Vorhaben priorisieren** Eine begründete Rangfolge je Portfolioebene festlegen.	PRAT, GLPA, DIR	Q6 F1, F2, F7
PP.02.03	**Abhängigkeiten zwischen Vorhaben erfassen** Abhängigkeiten zu anderen Projekten mit Ansprechperson festhalten.	UE, PL	Q7 Kap. 6; Q4
PP.02.04	**Projektkategorie zuordnen** Kategorie A strategisch, B Geschäftsleitung oder C Direktion festlegen und damit das Portfolio.	UE, GL	Q7 Kopf; Q6 F1, F4
PP.02.05	**Vorhaben mit strategischen Zielen verknüpfen** Handlungsfeld, strategisches Ziel und allenfalls Jahresziel zuordnen.	PL, SP	Q7 Kap. 2; Q6 F3, F7

Portfolioplanung. Fortsetzung.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PP.03 SZENARIEN UND BALANCING			
PP.03.01	**Portfolioszenario erstellen** Varianten der Zusammensetzung durchspielen, ohne den Ist-Stand zu verändern.	UE	Q1; Q5
PP.03.02	**Szenario gegen Budget und Kapazität prüfen** Die Wasserlinie ziehen: was mit den verfügbaren Mitteln umsetzbar ist.	UE, FI	Q6 F8 «Waterline»
PP.03.03	**Szenarien vergleichen** Die beste Variante nach Kosten, Nutzen, Risiko und Strategiebeitrag ermitteln.	UE, PRAT	Q3; Q5
PP.03.04	**Portfolio in Matrixsicht beurteilen** Vorhaben nach Nutzen und Risiko einordnen: priorisieren, rasch umsetzen, opportunistisch, hinterfragen.	UE, PRAT	Q6 F9
PP.04 PORTFOLIOENTSCHEIDE			
PP.04.01	**Entscheidungsvorlage vorbereiten** Dem Ausschuss vollständige Entscheidungsgrundlagen zur Sitzung bereitstellen.	UE	Q6 F4
PP.04.02	**Portfolioentscheid erfassen** Priorisierung und Freigabe von Streams und Projekten festhalten.	PRAT	Q6 F2 Monatlicher Review
PP.04.03	**Portfolio-Roadmap publizieren** Die beschlossene Planung intern kommunizieren.	UE	Q6 F2, F3 «VR-Roadmap»
PP.04.04	**Projektorganisation festlegen** Sponsor, Sponsoren-Koalition, PL, CTL und Kernteam mit AKV benennen.	SP, UE	Q7 Kap. 8; Q6 F4, F5
PP.04.05	**Gate-Reviews einplanen** Die nächsten PRAT-Gate-Reviews aller Vorhaben als Traktandenplanung bündeln.	UE	Q7 Kap. 7.2; Q6 F2

Portfoliosteuerung.
Laufende Vorhaben im Griff.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PS.01 STATUSBERICHTERSTATTUNG			
PS.01.01	**Statusbericht erfassen** Phase, Abschlusstermin, nächsten Meilenstein, Status und Trend melden.	PL	Q6 F7 Dashboard
PS.01.02	**Statusbericht prüfen** Plausibilität sicherstellen und Rückfragen an die Projektleitung stellen.	UE	Q6 F4; Q1
PS.01.03	**Ausstehende Statusberichte nachverfolgen** Fehlende Berichte erkennen und einfordern.	UE	Q2
PS.01.04	**Terminabweichungen analysieren** Baseline und aufdatierte Phasen- und Abschlusstermine über alle Vorhaben vergleichen.	UE	Q7 Kap. 7.2
PS.02 PHASEN, GATES, MEILENSTEINE			
PS.02.01	**Phasenfreigabe beantragen** Den Gate-Übergang mit Antworten auf die Leitfragen beantragen.	PL, SP	Q6 F6
PS.02.02	**Phasenfreigabe entscheiden** Am Gate zwischen P0 und P4 über die Weiterführung entscheiden.	PRAT	Q6 F6
PS.02.03	**Meilenstein abnehmen** Meilensteine und Ergebnisse im monatlichen Review abnehmen.	PRAT, SP	Q6 F2 Monatlicher Review
PS.02.04	**Meilensteinplan pflegen** Lieferergebnisse und Meilensteine je Phase mit Termin führen, Baseline und aufdatiert.	PL	Q7 Kap. 7; Q6 F7
PS.02.05	**Projektvertrag fortschreiben** Am Gate um die Inhalte der nächsten Phase ergänzen und als neue Version vorlegen.	PL	Q7 Handhabung, Kap. 7.1

Portfoliosteuerung. Fortsetzung.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PS.03 ÄNDERUNGEN UND ESKALATIONEN			
PS.03.01	**Änderung am Projektvertrag beantragen** Wesentliche Änderung an Zielen, Umfang, Terminen oder Budget vorlegen.	PL	Q7 Kap. 12
PS.03.02	**Änderung am Projektvertrag entscheiden** Die Änderung freigeben oder ablehnen; die Baseline wird nachgeführt.	AG	Q7 Kap. 12
PS.03.03	**Eskalation behandeln** Ungelöste Probleme dem Ausschuss zum Entscheid vorlegen.	PL, SP, PRAT	Q6 F2, F4
PS.03.04	**Vertragsversionen vergleichen** Hauptänderungen seit der letzten Version zeigen.	PL, UE, PRAT	Q7 Kopf
PS.04 ABSCHLUSS			
PS.04.01	**Vorhaben abschliessen** Am Exit-Gate P4 Kosten/Nutzen prüfen und an die Linie übergeben.	PL, SP, PRAT	Q6 F6 Exit P4
PS.04.02	**Vorhaben sistieren oder abbrechen** Ein Vorhaben begründet anhalten oder beenden und Ressourcen freigeben.	PRAT	Q6 F9 «ggf. stoppen»
PS.04.03	**Lessons Learned erfassen** Erkenntnisse für künftige Vorhaben festhalten.	PL, UE	Q6 F2 Rückblick; Q3

Portfoliosteuerung. Fortsetzung.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PS.05 STAKEHOLDER UND KOMMUNIKATION			
PS.05.01	**Stakeholder erfassen** Betroffene Gruppen mit Interesse, Einfluss und geplanten Massnahmen festhalten.	PL, SP	Q7 Kap. 11.1; Q6 F2
PS.05.02	**Kommunikationsplan erstellen** Massnahmen mit Adressat und Ziel planen.	PL, SP	Q7 Kap. 11.2; Q6 F2
PS.05.03	**Kommunikationsmassnahme nachführen** Durchgeführte Massnahmen wie einen Meilenstein als erledigt melden.	PL	Q6 F7 Meilenstein

Wer betroffen ist, hört es zuerst.
Und nicht aus der Zeitung.

Portfoliocontrolling.
Geld, Risiko, Nutzen.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PC.01 FINANZEN			
PC.01.01	**Projektbudget planen** Kosten je Phase mit Lieferant, Offerte und CAPEX/OPEX planen.	PL, FI	Q7 Kap. 9.1
PC.01.02	**Ist-Kosten übernehmen** Aktuelle Ist-Kosten aus dem ERP verfügbar haben, ohne Handerfassung.	FI (System)	Q2 [OFFEN]
PC.01.03	**Kostenprognose aktualisieren** Die erwarteten Gesamtkosten bis Projektende realistisch ausweisen.	PL	Q5
PC.01.04	**Budgetabweichungen analysieren** Überschreitungen im Portfolio früh erkennen und Ursachen klären.	FI, UE	Q3
PC.01.05	**Budgetbedarf in den Budgetprozess übergeben** Aus den Kosten je Phase den Jahresbedarf CAPEX/OPEX ableiten und einspeisen.	GL, FI	Q6 F2; Q7 Kap. 9.1 [OFFEN]
PC.02 RISIKEN			
PC.02.01	**Portfoliorisiko erfassen** Vorhabenübergreifende Risiken mit Bewertung festhalten.	UE	Q6 F9; Q1
PC.02.02	**Risikolage des Portfolios beurteilen** Die Gesamtrisikolage aus Projekt- und Portfoliorisiken überblicken.	UE, PRAT	Q6 F9
PC.02.03	**Risikomassnahme verfolgen** Sicherstellen, dass beschlossene Massnahmen umgesetzt werden.	UE, PL	Q1
PC.02.04	**Projektrisiko erfassen** Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (hoch/mittel/tief) und Massnahme festhalten.	PL	Q7 Kap. 10; Q6 F9

Portfoliocontrolling. Fortsetzung.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
PC.03 NUTZEN UND KPIS			
PC.03.01	**Projekt-KPIs festlegen** Messbare Nutzen- und Projekt-KPIs mit Zielwert definieren (bisher «Nutzenziele festlegen»).	SP, PL	Q6 F1, F2
PC.03.02	**Nutzenrealisierung überprüfen** In Stabilisierung und am Exit prüfen, ob der Nutzen stabil erreicht ist.	SP, UE	Q6 F6 P3–P4
PC.04 REPORTING			
PC.04.01	**Portfolio-Dashboard einsehen** Den Stand je Portfolioebene auf einen Blick erfassen, auch als Funnel nach Phase.	PRAT, GLPA, DIR	Q6 F1, F7, F8
PC.04.02	**Portfoliobericht erstellen** Den periodischen Bericht für das jeweilige Gremium bereitstellen.	UE	Q6 F1 «Projekt Reporting»
PC.04.03	**Ad-hoc-Auswertung erstellen** Spezifische Fragen mit Filtern und Auswertungen beantworten.	UE, FI	Q3

Nutzen messen, nicht behaupten. Auch nach Projektende.

Ressourcen.
Wer macht es, und wann.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
RK.01 KAPAZITÄTSANGEBOT			
RK.01.01	**Kapazitätsangebot planen** Die für Vorhaben verfügbare Kapazität je Ressourcenpool festlegen.	RM	Q4 [OFFEN]
RK.01.02	**Personal- und Abwesenheitsdaten übernehmen** Das Kapazitätsangebot ohne Doppelerfassung aktuell halten.	RM (System)	Q2 [OFFEN]
RK.02 BEDARF UND ZUTEILUNG			
RK.02.01	**Ressourcenbedarf anmelden** Den Bedarf eines Vorhabens anmelden, mindestens als Grösse S/M/L.	PL	Q6 F8
RK.02.02	**Ressourcen zuteilen** Angemeldeten Bedarf mit konkreten Personen decken.	RM	Q3
RK.02.03	**Ressourcenkonflikt auflösen** Überbuchungen zwischen Vorhaben gemäss Priorität bereinigen.	RM, UE	Q6 F9 «sofern Kapazität verfügbar»
RK.02.04	**Auslastung analysieren** Engpässe und Unterauslastung erkennen.	RM, UE	Q6 F8 «Waterline»
RK.02.05	**Ressourcenbedarf präzisieren** Personal in FTE und Monaten je Rolle und Phase planen.	PL	Q7 Kap. 9.2; Q6 F6
RK.02.06	**ICT- und Infrastrukturbedarf anmelden** Den Bedarf früh bei den zuständigen Stellen melden, damit die Gates ihn prüfen können.	PL, SP	Q6 F6 Leitfragen ICT, Infrastruktur

BUSINESS MODULE AM

Application Management. Was alle brauchen.

ID	BUSINESS CASE · ZIEL	AKTEURE	HERLEITUNG
AM.01 BENUTZER UND BERECHTIGUNGEN			
AM.01.01	**Benutzer verwalten** Personen Zugang zum System geben oder entziehen.	ADM	Q1
AM.01.02	**Rolle mit Berechtigungen definieren** Die Rollen der Programm- und Projektebene abbilden.	ADM	Q6 F4
AM.01.03	**Stellvertretung regeln** Abwesenheiten ohne liegende Freigaben überbrücken.	alle, ADM	Q3; Q2
AM.02 STAMMDATEN UND KONFIGURATION			
AM.02.01	**Organisationseinheiten verwalten** Organisation inklusive Direktionen aktuell halten.	ADM	Q6 F1
AM.02.02	**Codetabellen pflegen** Auswahlwerte wie Status, Trend und Grössen S/M/L zentral pflegen.	ADM	Q6 F7, F8
AM.02.03	**Phasenmodell und Gates konfigurieren** Phasen P0–P4, Gates, Leitfragen sowie Standard-Lieferergebnisse und -Meilensteine abbilden.	ADM, UE	Q6 F6; Q7 Kap. 7.1
AM.02.04	**Portfolioebenen und Gremien konfigurieren** Drei Portfolios mit Gremium und Dashboard abbilden.	ADM, UE	Q6 F1, F4
AM.03 VORLAGEN, SCHNITTSTELLEN, PROTOKOLL			
AM.03.01	**Vorlagen verwalten** Vorlagen wie den Projektvertrag und die Berichte bereitstellen.	ADM, UE	Q7
AM.03.02	**Schnittstelle konfigurieren** Datenaustausch mit Umsystemen einrichten und überwachen.	ADM	Q2
AM.03.03	**Änderungsprotokoll einsehen** Nachvollziehen, wer wann was geändert hat.	ADM, UE	Q1


Was noch offen ist.
Und was wir annehmen.

Offene Punkte

- **Abkürzungen** Wofür stehen GLPA, DIR, AeD, PFLE, DMS, DRC, «CP» und «Streams»?
- **Auftraggeber und Sponsor** Sind das verschiedene Personen? Was ist die Sponsoren-Koalition?
- **Kategorie B und C** Gelten Projektvertrag, Gates und Quality Review auch für GL- und Direktionsprojekte?
- **Kriterienraster** Welche Kriterien und Gewichte führen zur Kategorie A, B oder C?
- **Zeithorizont** Strategie 2035 (F1) oder Ziele 2030 (F3)? 3–5- oder Dreijahresziele?
- **Finanzen** Kosten je Phase, Budget je Jahr: wie umrechnen? Woher kommen Ist-Kosten?
- **PM-Handbuch** Es ist Basis des Projektvertrags. Können wir es als Quelle erhalten?

Annahmen

- Strategiearbeit und PESTEL-Analyse liegen ausserhalb des Systems.
- Das Transformationsprogramm entspricht dem strategischen Portfolio.
- Der Projektvertrag wird als Daten je Projekt geführt; das Dokument entsteht daraus.
- Auf Projektebene nur Portfoliorelevantes: Status, Meilensteine, Budget, Risiken, Ressourcen, KPIs, Kommunikation.

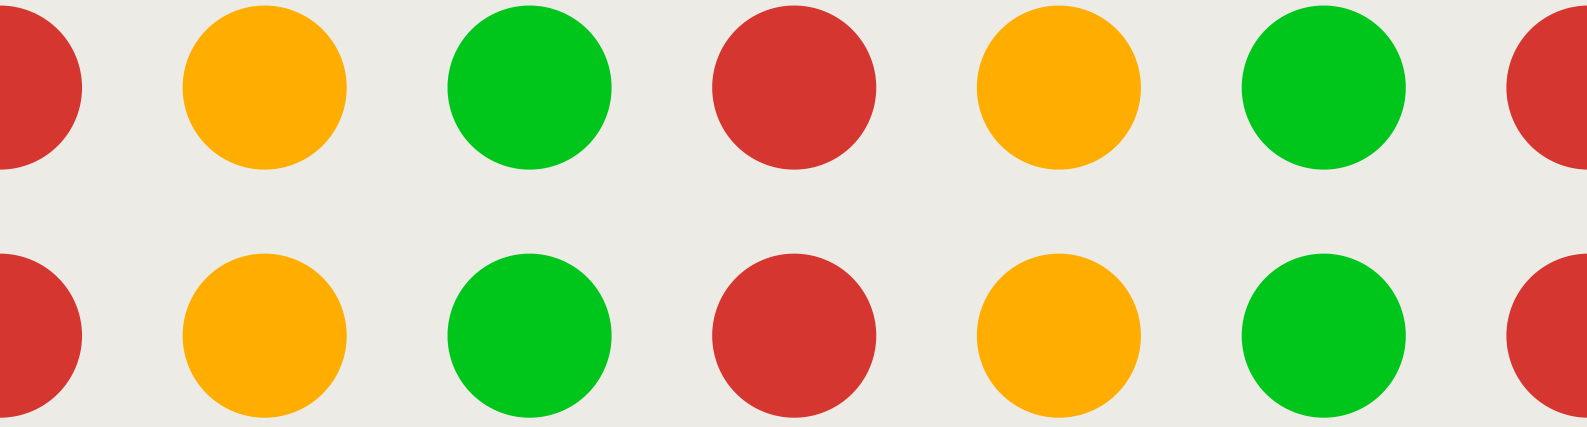

Solutions CSP

Dein Kontakt

André Hochreutener

andre.hochreutener@csp-ag.ch
